





令和5年台風第13号に係る 災害廃棄物処理の対応について

いわき市ごみ減量推進課

R6.2.5災害廃棄物対策東北ブロック協議会資料

被害状況

台風13号被災箇所位置図

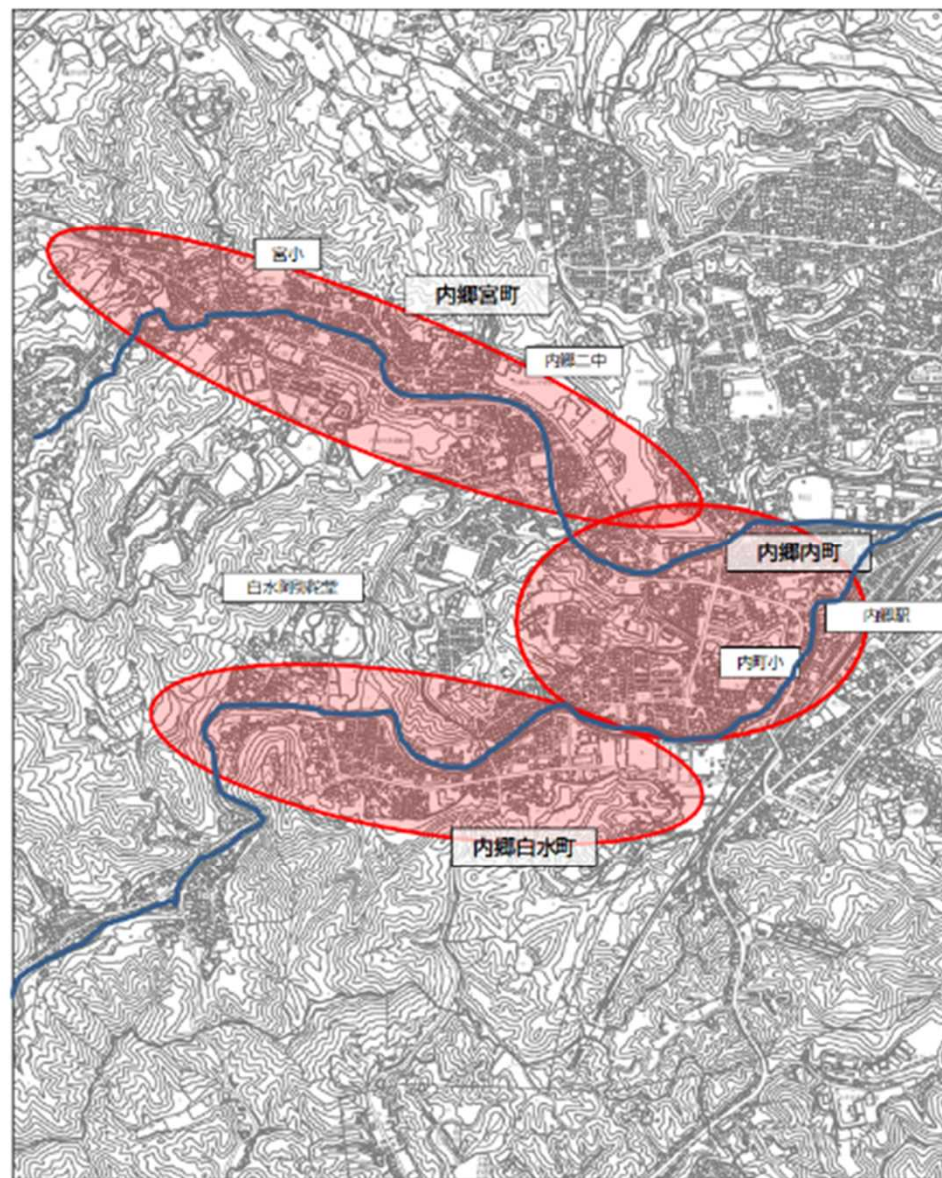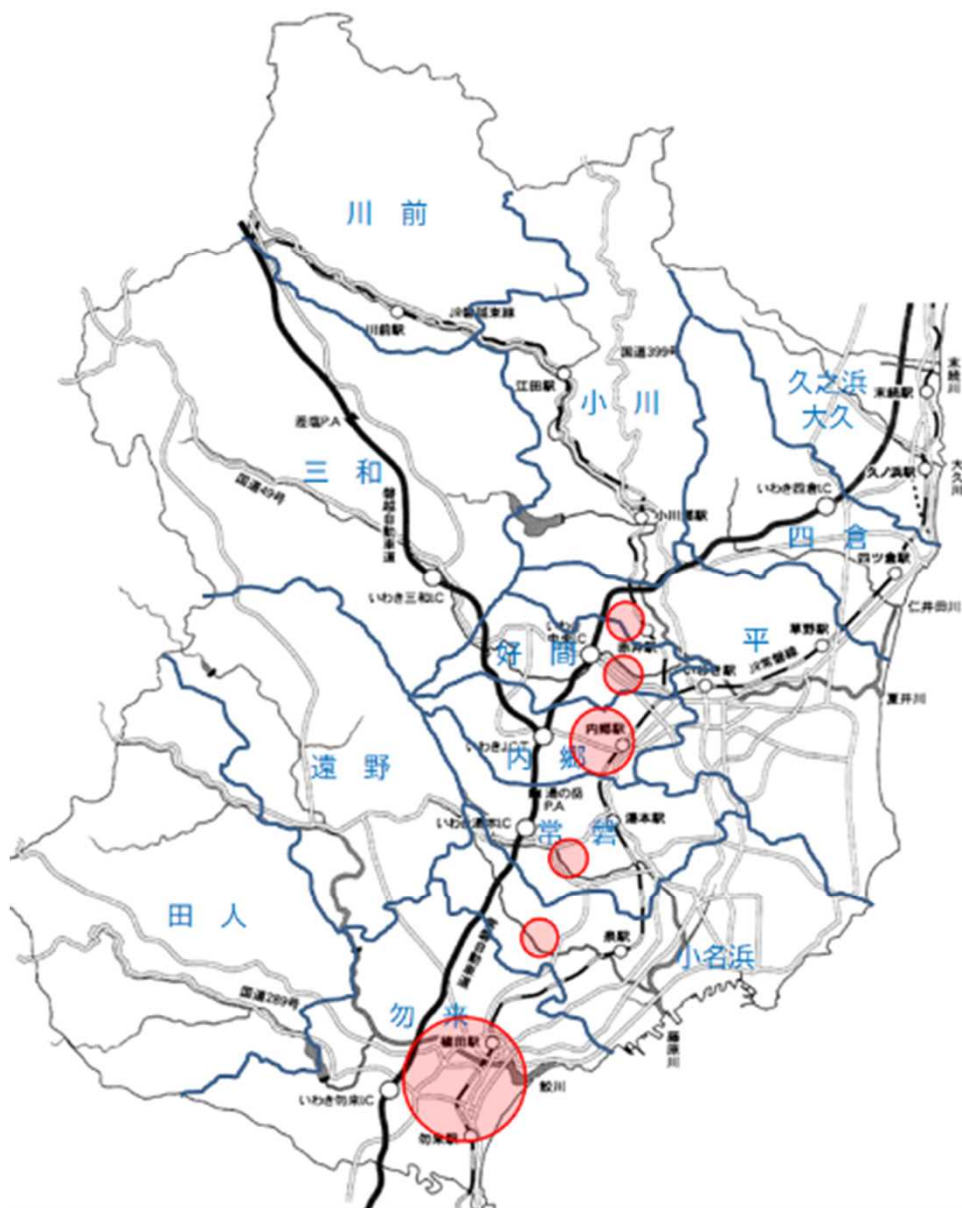

被害状況(11/30現在)

(1/2)

○人的被害

死者 1名
負傷者(軽傷) 5名

○住家被害

全壊 11棟
大規模半壊 54棟
中規模半壊 200棟
半壊 596棟
準半壊 25棟
一部損壊 909棟

○公共施設被害

道路・橋梁 308箇所
河川等 81箇所
公園施設 4箇所
下水道施設 10箇所
農業土木施設 578箇所
林道施設 121箇所
商工観光施設 1箇所
水道施設 9箇所
文教施設 11箇所
その他(市営住宅等) 19箇所

り災調査によるもの

床上浸水 885棟
床下浸水 806棟



被害状況(11/30現在)

(2/2)

○その他

がけ崩れ	111箇所
農地被害	218箇所
農林業施設被害	27件
農作物被害	15件
水産業施設	1件
商工観光施設	130事業所
その他の施設	46件



災害廃棄物対応時系列

(1/2)

月日	時刻	内容
9/8	10:00	関係団体()へ連絡、災害廃棄物処理の事前準備要請
	16:45	大雨警報
	19:39	線状降水帯発生
	20:40	いわき市災害本部第3配備体制(全職員出動) 3名出動 その外は翌日
9/9	07:00	被害状況の現地確認、災害廃棄物仮置場候補地の現地確認開始
	12:15	仮置場開設見込み公表 9/11(計画:発災後3日以内)までに開設を予定
	13:00	関係団体打合せ(災害廃棄物の収集運搬、仮置場開設)
	19:03	災害廃棄物の仮置場等の開設について公表 9/11 9:00~
9/10	17:36	環境省東北地方環境事務所職員来庁(以後継続して指導・助言)

()災害時応援協定締結団体:災害廃棄物収集・運搬 2団体、処理・処分 1団体

災害廃棄物対応時系列

(2/2)

月日	時刻	内容
9/11	09:00	仮置場等の開設(仮置場3、臨時集積所3)
9/12	13:00	災害廃棄物運搬車両の貸出し(軽トラック)
9/14	17:00	関係団体打合せ(災害廃棄物の収集運搬・処理スケジュール)
9/16		消防団による災害廃棄物の収集運搬支援(9/16~18・24)
9/25		仙台市による災害廃棄物の収集運搬支援(9/25~10/7)
9/30		災害廃棄物撤去完了(幹線道路沿い、狭い路地の集積所など)
10/9	16:00	仮置場の受入終了(戸別収集は継続)、運搬車両貸出し終了
10/31	16:30	災害廃棄物の戸別収集受付終了
11/21	10:00	損壊家屋等の解体撤去・運搬処分の実施公表(相談予約11/27~)

仮置場受入状況

仮置場設置 9月11日(月)～10月9日(月) 29日間

○受入件数 10,907件

区分	施設名	地区	受入件数
仮置場	勿来市民運動場	勿来	1,981件
	常磐市民運動場	常磐	2,848件
	内郷市民運動場	内郷	6,078件
臨時 仮置場	馬場児童遊園	内郷	
	内町公園	内郷	
	旧常磐塵芥収集基地	常磐	



災害対応のふりかえり

- ・ 仮置場の設置は、関係団体の協力により1日半で準備を行い、発災後3日目の朝から受け入れを開始できた。
- ・ 環境省のプッシュ型指導・助言、仙台市の支援により、災害廃棄物処理が迅速かつ適切に進められた。
- ・ スケジュールを作成し、優先順位、進め方、目標期日などを関係団体と共有したことで処理の迅速化が図れた。
- ・ 一方、仮置場が設置されるまでの間、災害廃棄物が公園等に分別されずに集積された。
- ・ 戸別収集について依頼件数が多く、依頼場所の特定や収集実績との照合に苦慮した。

